OneFlow er ikke «gul». Kostnaden er 472 mill., sluttdatoen er juni 2027, og uten handling nå blir det verre

472 mill.
forventet sluttkost, netto
Rapportert 395, ramme 280

30.6.2027
ny sluttdato, mest sannsynlig
Vedtatt 31.12.2026

128 mill.
varig årlig gevinst fra 2029
Opprinnelig 210 fra 2028

146 mill.
kontraktsverdi som fornyes før 31.12
71 mill. peker på OneFlow

Problemet

409 mill. er brukt eller bundet. Rammen på 280 er sprengt.

Styret har sett 395 og «gul». Finans hadde 438 i juni og 459 i august. Sporene er 11–26 uker bak.

Servicen faller: SLA 95,8 → 91,4 %, churn 5,0 → 6,7 %, og 7,8 % fakturakorreksjon i piloten.

Hvis vi ikke handler nå

Kost og dato: 31.12 passeres uten at Bølge 1 er gjennomført. Kostnaden løper ca. 15 mill. i måneden, mot 506 mill. uten kreditt.

Penger: Convergents kreditt på 24–34 mill. faller bort uten scope-frys og felles plan.

Kunder: Fem fornyelser forfaller før 31.12. Skaleres piloten til 286 kunder, trengs manuell kontroll som drift bare har kapasitet til for 50.

Folk: 12 nøkkelpersoner har sluttet. Lokalkunnskap kan ikke kjøpes inn.

Hvorfor nå: banken møtes 25.9, første fornyelse er 15.10, og styret krever at vesentlige endringer legges frem uten opphold.

Kilde: FIN-005/007, OF-011, OPS-001/003/004, HR-002. 15 mill./mnd er avledet.

Vi anbefaler at styret i dag godkjenner et kontrollert konsernreset og beslutter seks ting

#	Beslutning	Hvem	Frist
D1	**Ny kostnad og dato:** 472 mill. og 30.6.2027 erstatter 395. Frigi bare forpliktet beløp til 16.10.	Styret	I dag
D2	**Beslutningsrett:** CEO avgjør. 72 timers frist, scope-frys og håndhevede porter.	CEO	22.9
D3	**Stans nye bølger** til fakturakontroll og eierskap er løst. Utnevn én eier av kunderisikoen.	CEO	22.9
D4	**Beskytt folkene:** skjerm de 23 kritiske rollene og finansier backfill.	CEO og CFO	2.10
D5	**Leverandør:** scope-frys mot kreditt. Krev 34 mill., regn med 12.	CFO og CIO	9.10
D6	**Verifiser:** uavhengig teknisk kontroll og ekte NPV, med port 16.10.	CIO og CFO	16.10

Anbefalingen står og faller på

CEO-mandat 22.9. Uten det står alle tiltak i første uke stille.

Scope-frys før Convergent-avtalen. Uten frys faller kreditten på 24–34 mill.

Skjerming før backfill. Nye folk uten prioriteringsregel trekkes tilbake som i mai og juli.

At kjernen er levedyktig. Verifiseres innen 16.10. Finner vi strukturelle feil, kommer saken tilbake til styret.

Ikke på bordet i dag: full stopp, leverandørbytte og redesign. Ingen av dem har støtte i analysen.

Kilde: hovedanbefalingen og 90-dagersplanen. D1-utformingen er teamets forslag.

Rotårsaken er vår egen styring. Leverandør og teknologi forklarer mindre, så løsningen må være et konsernreset

Hypotese	Dom	Det viktigste beviset	Betyr for anbefalingen
«OneFlow er gul og håndterbar» (H1)	**Falsifisert**	409 mill. er brukt eller bundet mot 395 rapportert. Alle spor er 11–26 uker bak.	Erkjenn 472 og juni 2027
Rotårsak: styring og beslutninger (H3)	**Støttet**	Alle 12 kritiske saker tok over 4× målet (median 35,5 mot 7 dager). De blokkerer 10 av 18 integrasjoner.	**Konsernreset, ikke IT-reset**
Forsterker: kapasitet (H4)	Svekket som hovedårsak	49 FTE i gap, 37 over 120 %, 12 avganger. Gapet består fordi ingen prioriterer.	Skjerm roller, sett prioriteringsregel
Leverandøren er hovedårsak (H2)	**Falsifisert**	Leverandørfeil gjelder 5–6 av 18 integrasjoner. Begge parter sier minst halvparten er kundeskapt.	Kreditt som vilkår, ikke bytte
Kjernen er ikke levedyktig (H5)	Svekket	46 av 64 integrasjoner er klare. Bare 5–6 har kode- eller konfigfeil. Ingen uavhengig kontroll ennå.	Fortsett, men verifiser innen 16.10
Kundeskaden dominerer (H6)	Svekket	Målbar effekt er ≤ 22 mill. mot +77 i programkost. Men 146 mill. forfaller før årsslutt.	Stans nye bølger, utnevn én eier

Samlet: Nordflows egen beslutningsdisiplin er rotårsaken, og kapasitet forsterker den. Leverandør, teknologi og kunder er mindre årsaker eller konsekvenser.


Kilde: hypotesetestene H1–H6. Forbehold: H3 er støttet, men effekten på kritisk sti er ikke tallfestet.

Tolv tiltak, rangert etter effekt, trygghet og enkelhet. De seks øverste starter denne uken

#	Tiltak	Ansvarlig	Effekt	Trygg	Enkel	ICE	Avhengig av
1	Beslutningsregime og de seks åpne sakene	Karin Eide	10	8	7	**8,3**	CEO-mandat 22.9
2	Scope-frys med unntaksprosess	Thomas Vik	8	9	8	**8,3**	CEO-mandat 22.9
3	Én eier og plan per fornyelse	Eirik Solheim*	8	8	9	**8,3**	Navneavklaring kunder
4	472 mill. som eneste tall, ekte NPV	Thomas Vik	7	9	9	**8,3**	Ingen
5	Skjerm 23 roller, sett prioriteringsregel	Karin Eide	9	8	7	**8,0**	CEO-regel 22.9
6	Pause i bølger, fakturakontroll i pilot	Ragnhild Moen	8	8	7	**7,7**	Tiltak 11 (dataregler)
7	Uavhengig teknisk verifikasjon	Amina Rahman	8	7	6	**7,0**	Ingen
8	Convergent: frys mot kreditt	Thomas Vik	8	6	6	**6,7**	Tiltak 2 (scope-frys)
9	Kritisk sti-analyse og ny plan	Håkon Berg	7	7	6	**6,7**	Tiltak 1 og 4
10	Finansiert backfill, stabil kundedrift	Thomas Vik	8	6	5	**6,3**	Tiltak 5 (skjerming)
11	Data, forretningsregler og danske krav	Camilla Bruun	9	6	3	**6,0**	Tiltak 1 og 7
12	Integrasjoner, prosess, gjenoppstart	Håkon Berg	9	5	3	**5,7**	Tiltak 8, 11 og 6

ICE = snitt av effekt, trygghet og enkelhet (1–10), teamets vurdering. * Forslag til eier.

Dag 0–90: beslutninger og skjerming først, fakta til Port 1 den 16.10, og gjenoppstart først når kriteriene er oppfylt

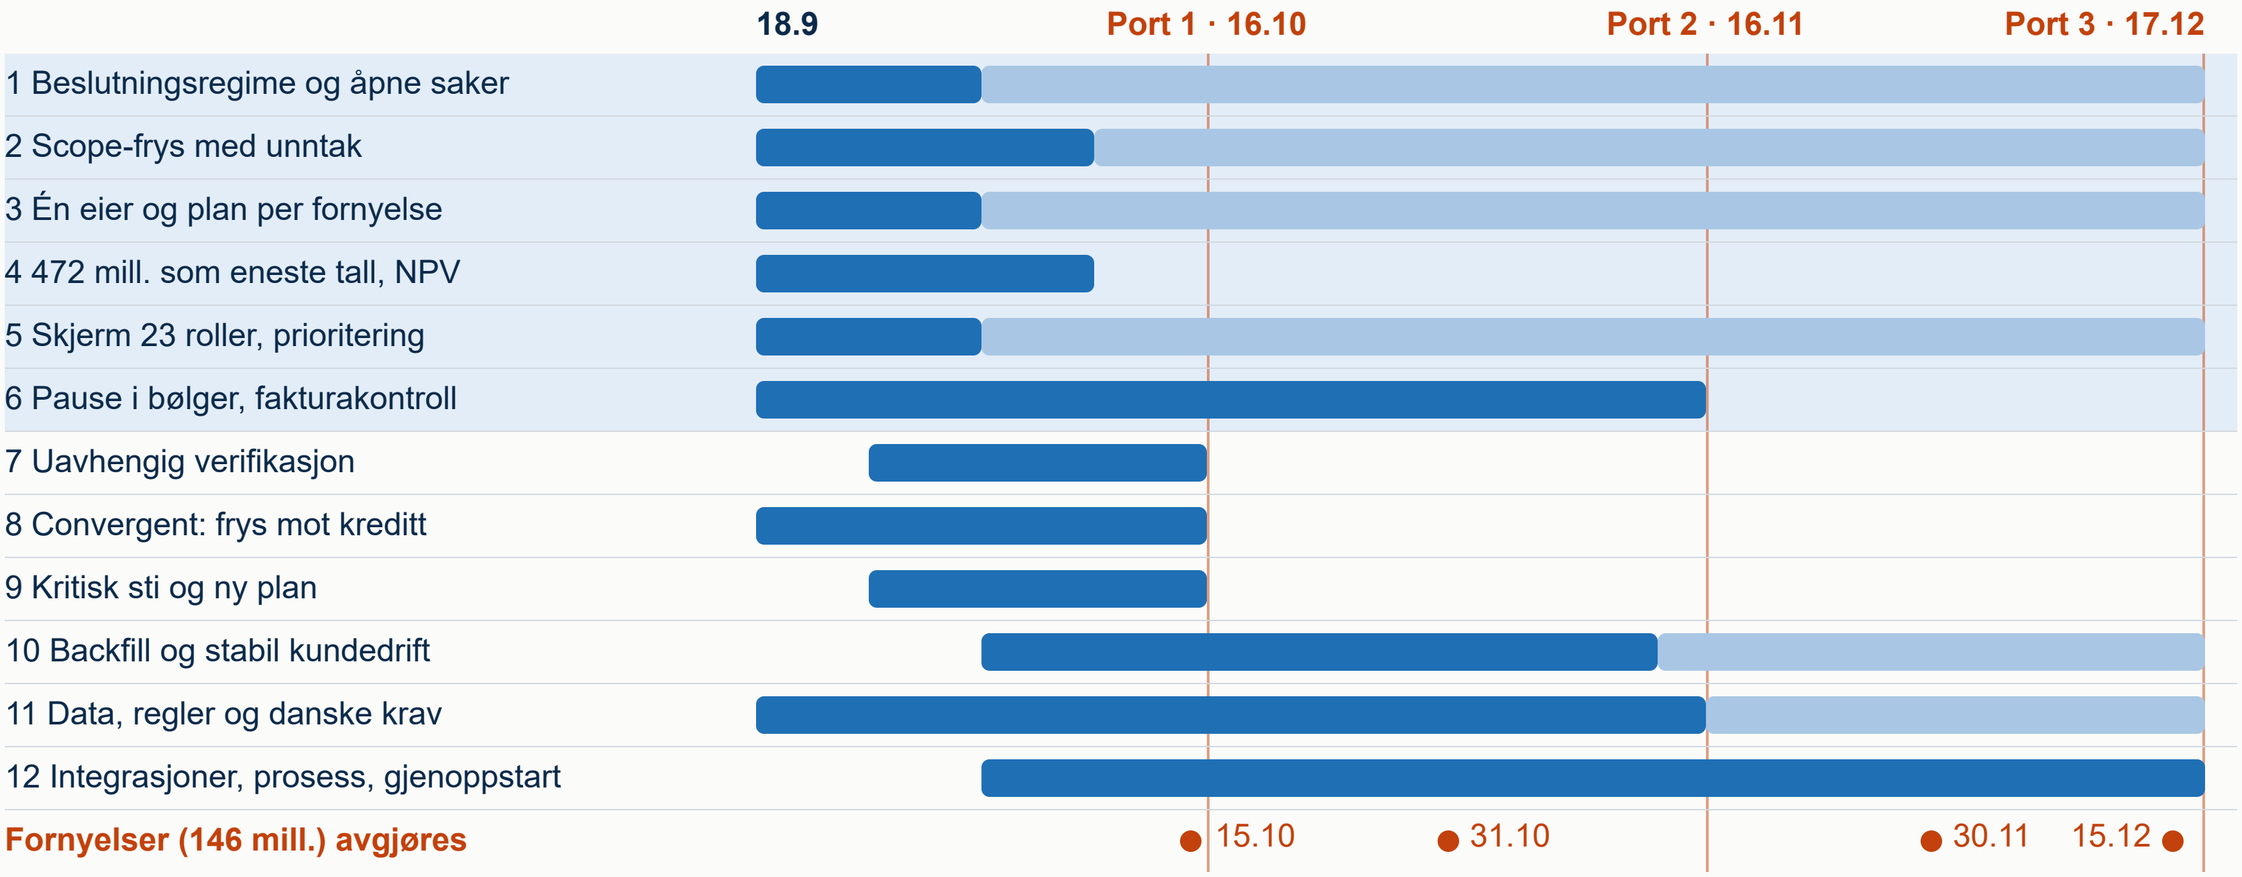

Mørk stolpe: innføring. Lys stolpe: drift og oppfølging. Blå rader starter denne uken. Kilde: 90-dagersplanen.

Hvis resetet lykkes, har vi én sann kostnad, trygge fornyelser og raske beslutninger. Åtte tall viser om vi er på rett vei

472 mill.
er eneste tall i all rapportering. Ny ramme vedtatt 16.10.

12–34 mill.
leverandørkreditt hentet hjem. Uten den ender vi på 506.

5 av 5
fornyelser (146 mill.) besluttet før 31.12, ingen tapt på faktura- eller portalfeil.

72 timer
til beslutning på kritiske saker, mot 35,5 dager i dag.

Indikator	I dag	Dag 28 (16.10)	Dag 90 (17.12)	Måles av
Beslutningstid, kritiske saker	35,5 dager	≤ 72 timer	≤ 72 timer	Julie Nystad
Skjermede kritiske roller	0 av 23	23 av 23	23 av 23	Lene Falk
Uferdige integrasjoner	18 av 64	≤ 14	≤ 8	Lars Pettersen
Pilot: fakturakorreksjon	7,8 %	< 5 %	< 2,5 %	Ragnhild Moen
SLA overholdt	91,4 %	≥ 91,4 %	≥ 93,0 %	Ingrid Mørk
Fornyelser med lederplan (146 mill.)	0 av 5	5 av 5	5 av 5 besluttet	Beate Høyer
Leverandørkreditt skriftlig	0	≥ 12 mill.	24–34 mill.	Thomas Vik

Rødt lys ved Port 1: arkitekturfeil, negativ NPV, beslutninger over 72 timer eller at Convergent avviser frys.

Mål er teamets forslag. Rapporteres ukentlig til CEO. Kilde: 90-dagersplanen.
